

## (医病) 附属病院2階外来待合ホール照明改修工事

外来ホールテーブル席の照度不足箇所にLEDを増設し、読書が可能な明るさを確保した。2階外来受付から入院準備室間の廊下照明を更新し、適切な明るさを確保した。

■ 敷地：沖縄県中頭郡西原町字上原207番地  
(上原団地)

■ 工事場所：2階外来ホール(ドトールのテーブル席)  
2階外来受付から入院準備室間の廊下

■ 工事概要：ドトール LED照明9台取付(計62W)  
廊下 LED照明17台取付(計134W)

■ 設計：琉球大学 施設運営部

■ 施工：国電

■ 工期：H28. 4. 28 ~ 29 (2日間)

■ 工事費：54万円

■ 成果：テーブル照度が  
130Lx→320Lx (246%アップ)  
廊下照度が  
50Lx→140Lx (280%アップ)




ドトール照明(改修前)



ドトール照明(改修後)



廊下照明(改修前)

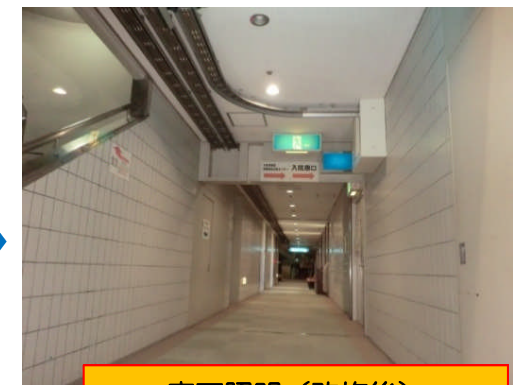

廊下照明(改修後)
