

老朽化した給排水管・ガス管・給湯器を全て更新しました。配管材は鋼管から塩ビ管に更新し、腐食等による劣化が発生しなくなった他、給湯器を屋外から屋内設置にしたことで長寿命化を図りました。

■ 敷 地： 沖縄県 中頭郡西原町字千原 1 番地

■ 工 事 概 要： ・給排水管更新 1式  
・ガス管更新 1式  
・給湯器更新 1式

■ 設 計： 琉球大学 施設運営部

■ 施 工： (資) 明光電気

■ 工 事 費 用： 17,064,000円

■ 工 期： H30年9月 ~ H31年2月 (6ヶ月)

■ 効 果： 設備の長寿命化



(改修前) ユニットバス




(改修後) ユニットバス




(改修前) 洗濯機パン



(改修後) 洗濯機パン

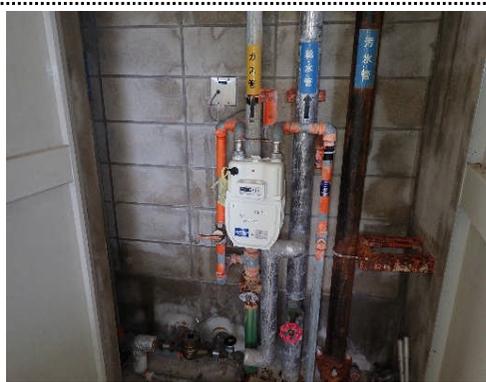

(改修前) パイプスペース

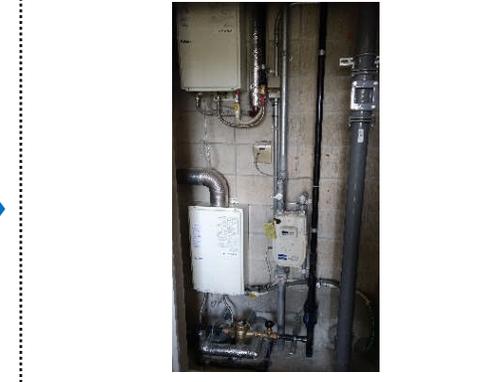

(改修後) パイプスペース  
給湯器設置
